

# COMUNE DI VALVASONE ARZENE

## REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

---

### REALIZZAZIONE DI N. 24 LOCULI NEL CIMITERO DI SAN LORENZO

#### PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE:

---

**Ufficio Lavori Pubblici – Comune di Valvasone Arzene**  
Piazza Mercato 1 - 33098 VALVASONE ARZENE (PN)  
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giulia LOMBARDO  
Codice Fiscale: 91003500930 – P.Iva: 00219160934

PROGETTISTA:

---

**LUCA CASETTA architetto**  
Ordine degli Architetti di Pordenone n. 415  
via Strada delle Liti 2 - 33080 Prata di Pordenone (PN)  
cell. 3394299959  
e-mail: [info@lucacasetta.com](mailto:info@lucacasetta.com) - e-mail PEC: [info@pec.lucacasetta.com](mailto:info@pec.lucacasetta.com)  
Codice Fiscale: CSTLCU71B19G888J - P.Iva: 01383460936

OGGETTO:

**CRONOPROGRAMMA**

CP

DATA:

---

GIUGNO 2023

# COMUNE DI VALVASONE ARZENE

## PROVINCIA DI PORDENONE

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI N. 24 LOCULI NEL CIMITERO DI SAN LORENZO

**COMMITTENTE:** COMUNE DI VALVASONE ARZENE

**IMPRESA:**

### RELAZIONE

### PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Il PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI allegato alla presente relazione, prescritto dal capitolato speciale d'appalto, è stato redatto in ottemperanza al comma 10 dell'articolo 43 del D.P.R. 207/2010.

#### Tempi di esecuzione

Dai calcoli effettuati, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole, è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **124** giorni naturali e consecutivi.

#### Andamento stagionale sfavorevole

Nella definizione della durata e della produttività delle attività si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

#### Tabella Climatico Ambientale:

| condizione  | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Favorevole  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 45  | 90  | 90  | 90  | 45  | 82.5  |
| Normale     | 15  | 15  | 75  | 90  | 90  | 90  | 90  | 45  | 90  | 90  | 75  | 15  | 65    |
| Sfavorevole | 15  | 15  | 45  | 90  | 90  | 90  | 90  | 45  | 90  | 75  | 45  | 15  | 58.75 |

La disposizione delle attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la reale produttività che l'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi indicati.

## Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal programma allegato verrà garantita, attraverso le risorse impegnate e l'organizzazione dei lavori, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 14'970,70 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 27'176,46 .

## Tabella Certificati di Pagamento


Nel Capitolato Speciale d'Appalto è stato previsto che il pagamento delle rate di acconto verrà effettuato ogni volta che il credito dell'impresa raggiunge la cifra di euro 21'000,00. Si riportano in seguito l'elenco dei Certificati di Pagamento da emettere:

- **SAL** n. 1 alla data 27/10/2023 **Importo** euro 21'455,67 - **Progressivo** euro 21'455,67.
- **SAL** n. 2 alla data 28/11/2023 **Importo** euro 21'242,41 - **Progressivo** euro 42'698,08.
- **SAL** n. 3 alla data 06/02/2024 **Importo** euro 20'301,92 - **Progressivo** euro 63'000,00.


ARZENE, 16/06/2023

L'Impresa  
( )


VISTO:  
Il Direttore dei Lavori  
(ARCHITETTO CASETTA LUCA)

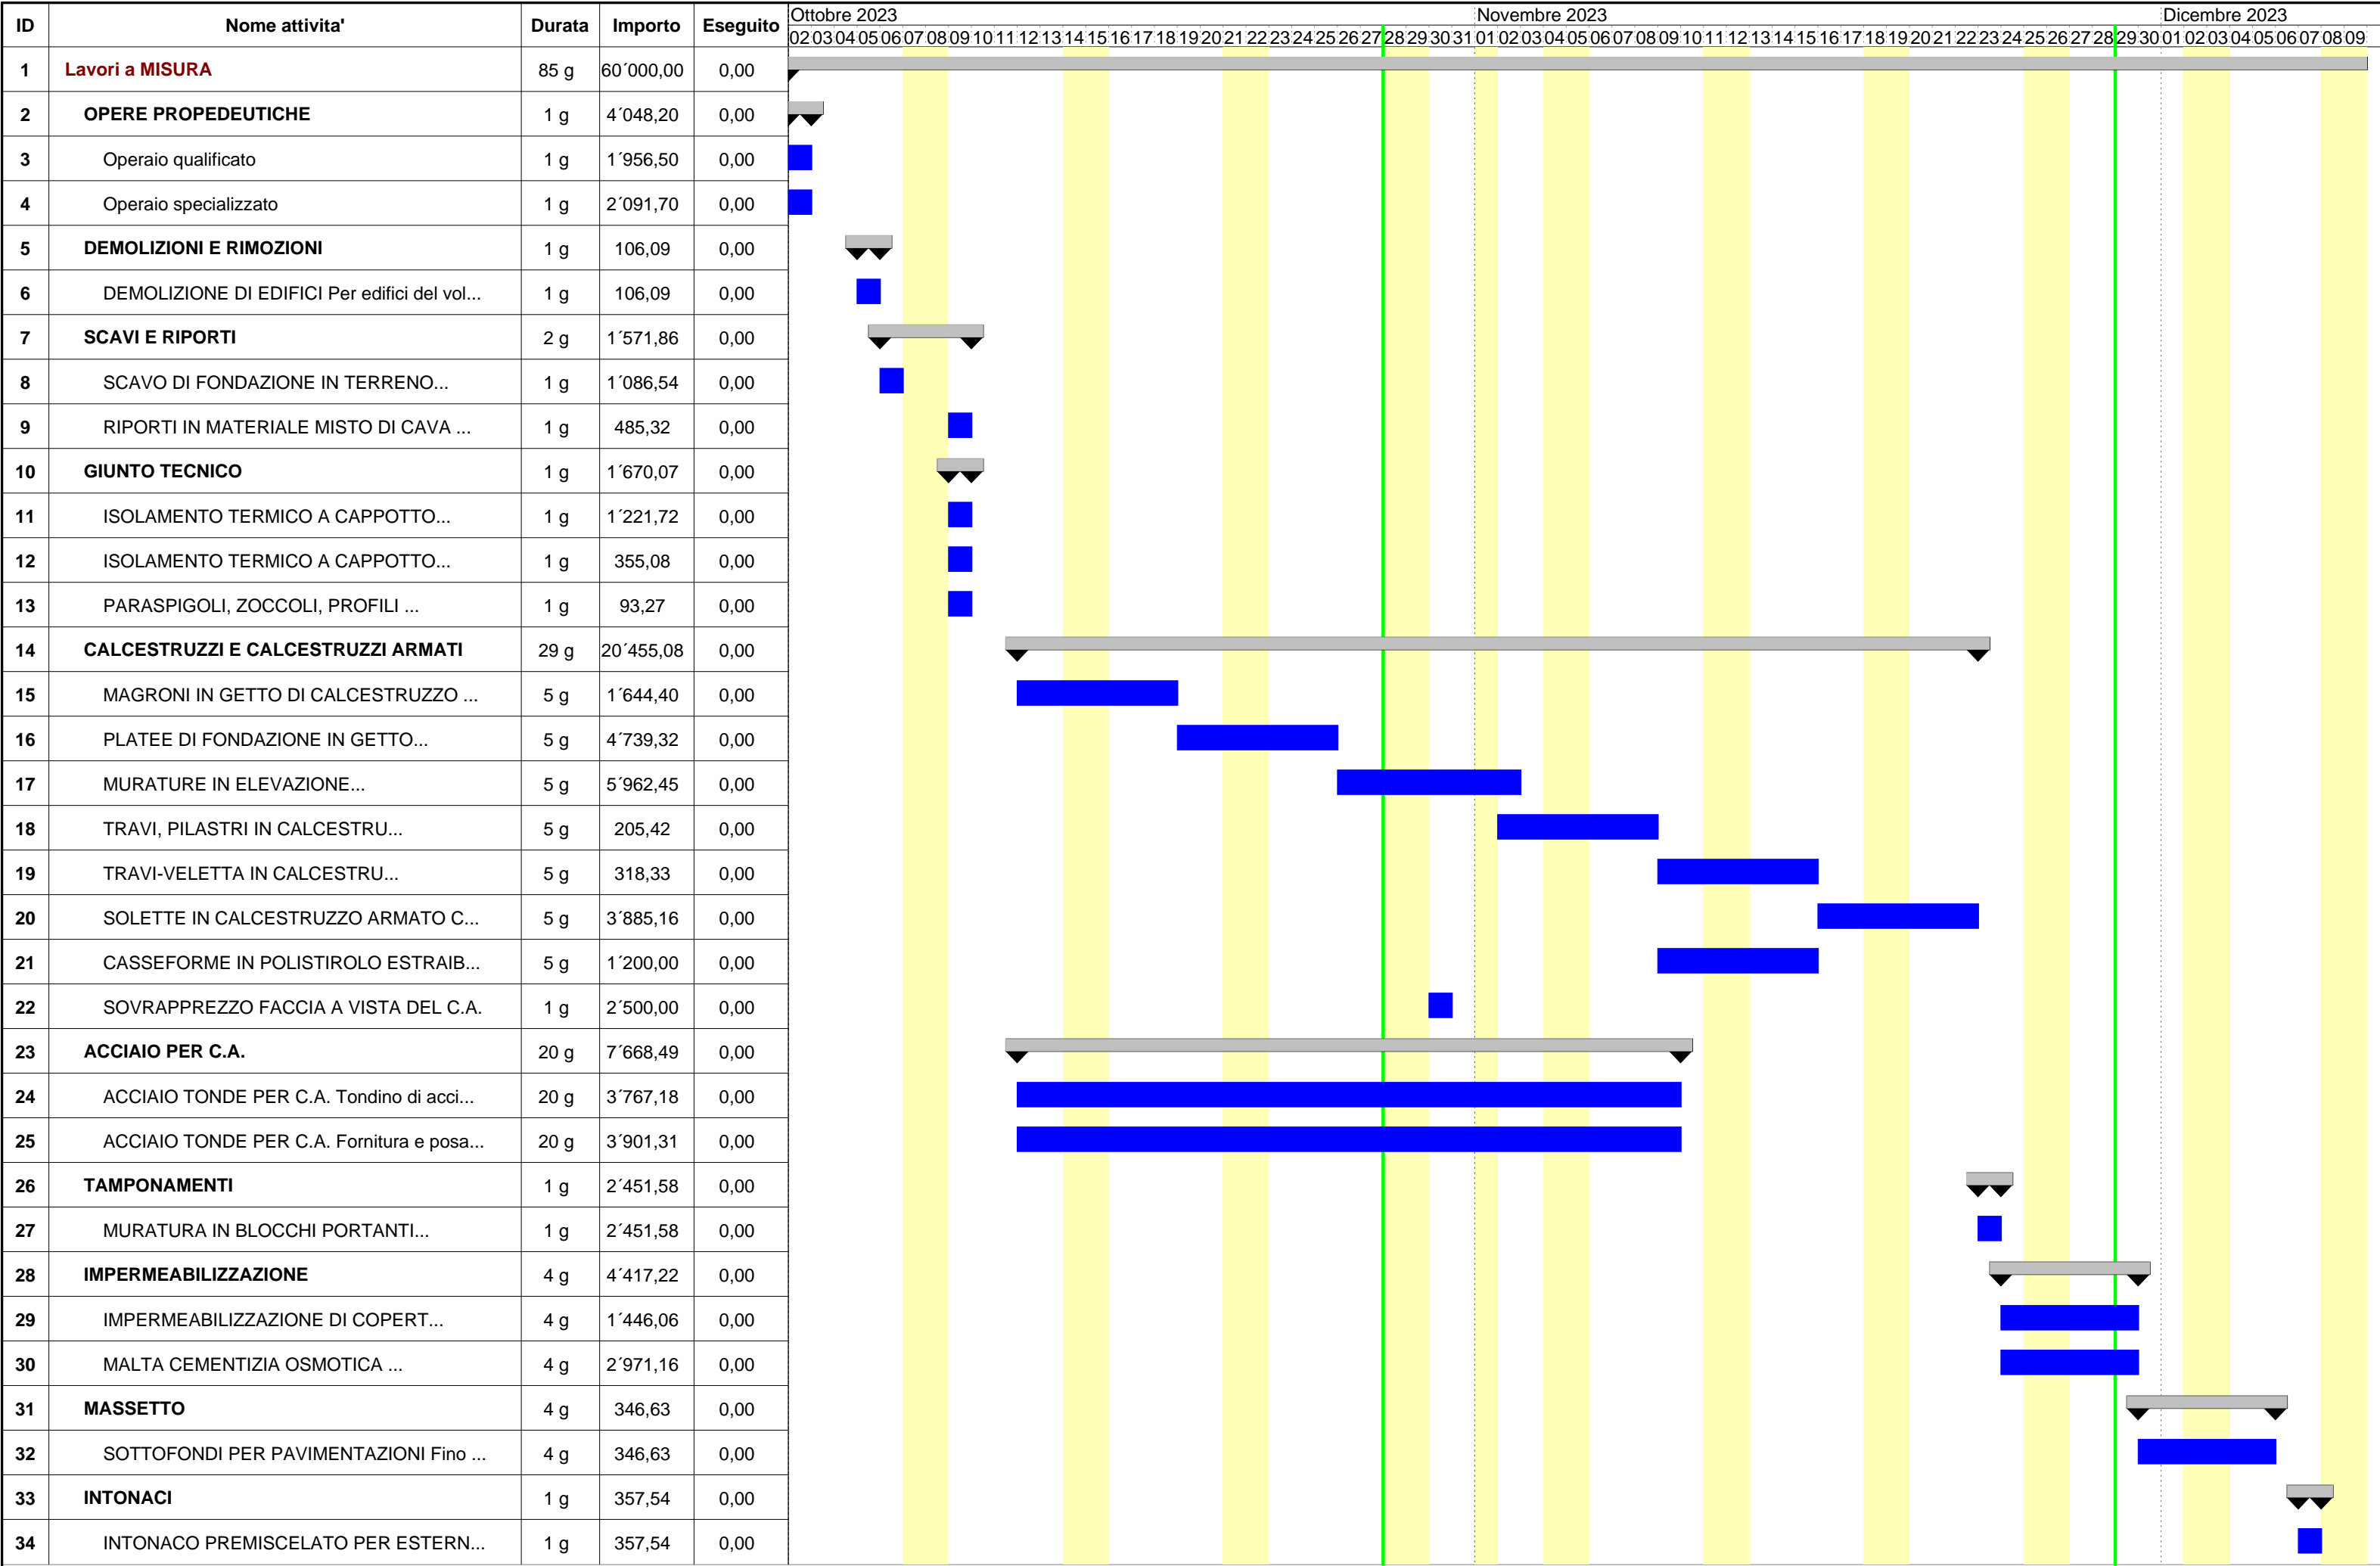

| ID | Nome attivita'                                | Durata | Importo  | Eseguito | Ottobre 2023 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Novembre 2023 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Dicembre 2023 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--------|----------|----------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
|    |   |        |          |          | 02           | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12            | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22            | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI              | 20 g   | 7'268,44 | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Fornitura e posa in opera di rivestimento ... | 4 g    | 884,62   | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 37 | PAVIMENTI IN MARMO In marmo di Trani          | 5 g    | 261,05   | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RIVESTIMENTI IN LASTRE DI PIETRA...           | 5 g    | 4'778,55 | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RIVESTIMENTI IN LASTRE DI PIE...              | 5 g    | 580,31   | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 40 | PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES F...          | 5 g    | 731,12   | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 41 | GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIME...           | 5 g    | 32,79    | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TINTEGGIATURA                                 | 5 g    | 604,91   | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IDROPITTURA LAVABILE SU SUPERF...             | 5 g    | 604,91   | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ACCESSORI PER LOCULI                          | 3 g    | 3'700,00 | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SIGILLI DI CHIUSURA LOCULI                    | 1 g    | 720,00   | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 46 | FRONTALINO COPERTURA                          | 2 g    | 2'500,00 | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 47 | FERRAMENTA PER LASTRE LOCULI                  | 1 g    | 480,00   | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IMPIANTO ELETTRICO                            | 1 g    | 1'000,00 | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IMPIANTO ELETTRICO                            | 1 g    | 1'000,00 | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 50 | OPERE DI COMPLETAMENTO                        | 7 g    | 4'333,89 | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 51 | SISTEMAZIONE GENERALE DELL'AREA               | 5 g    | 2'833,89 | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO LAP...             | 2 g    | 1'500,00 | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 53 | COSTI SICUREZZA (speciali)                    | 87 g   | 3'000,00 | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Costi della sicurezza dei soli apprestamen... | 87 g   | 3'000,00 | 0,00     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |

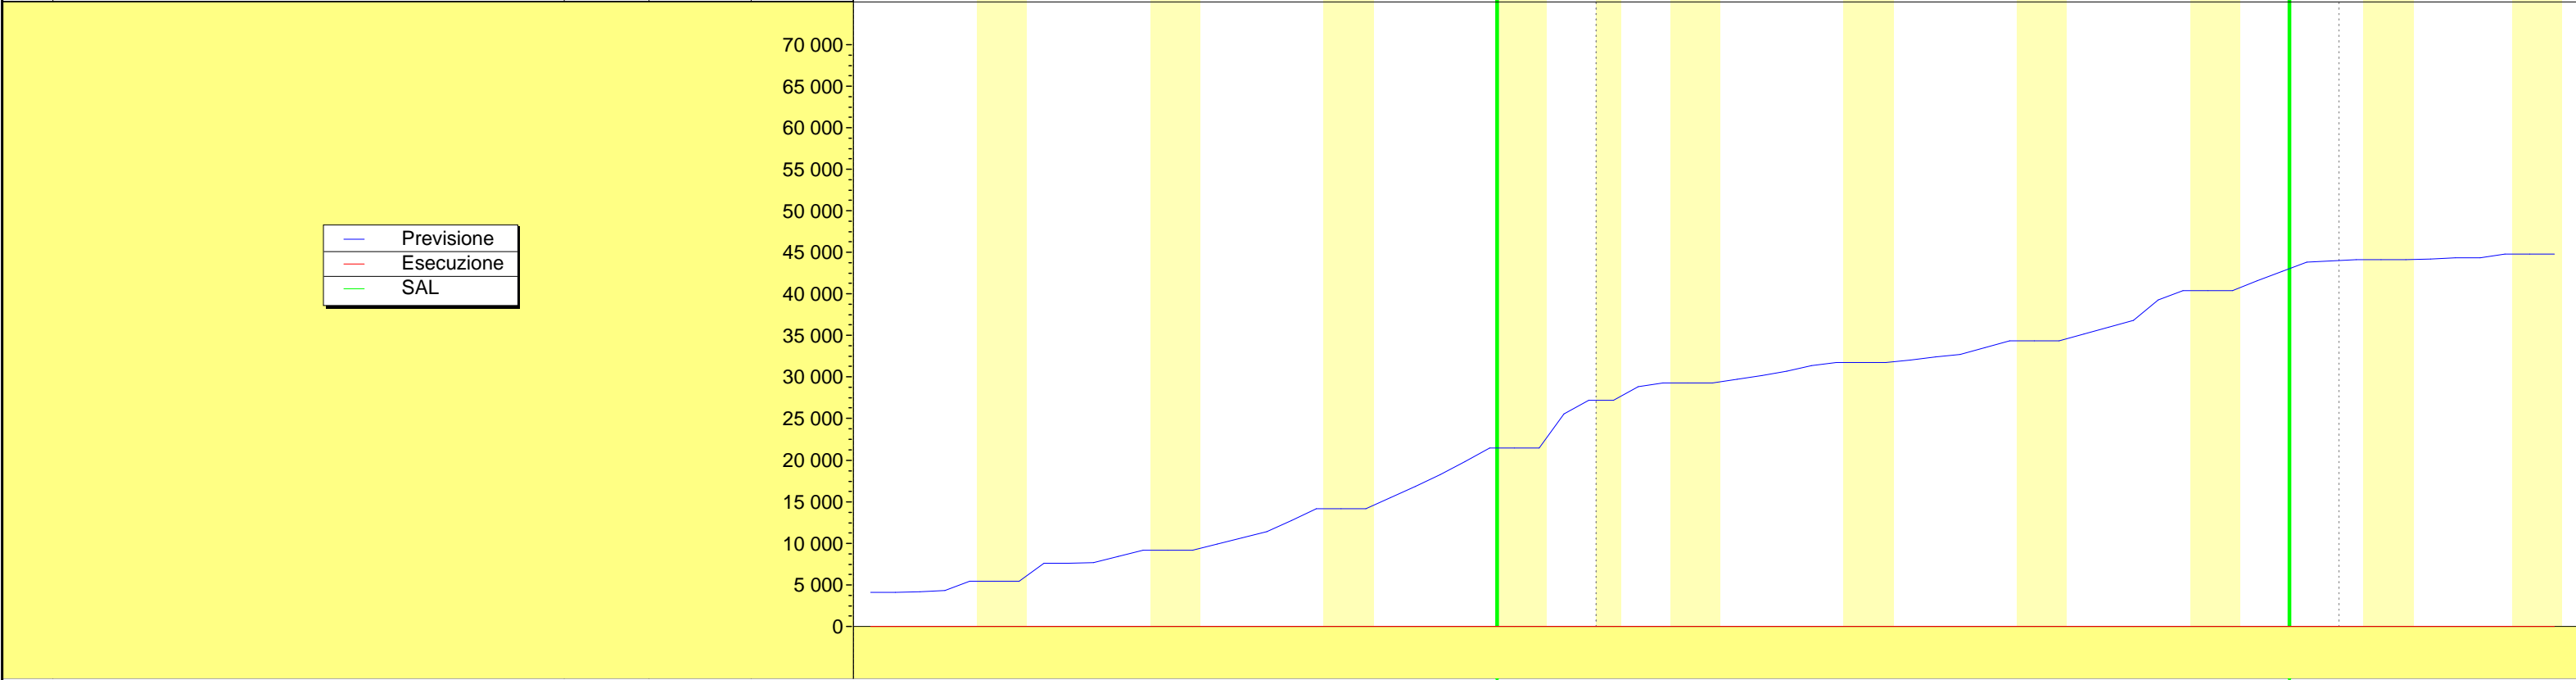

[illegible]

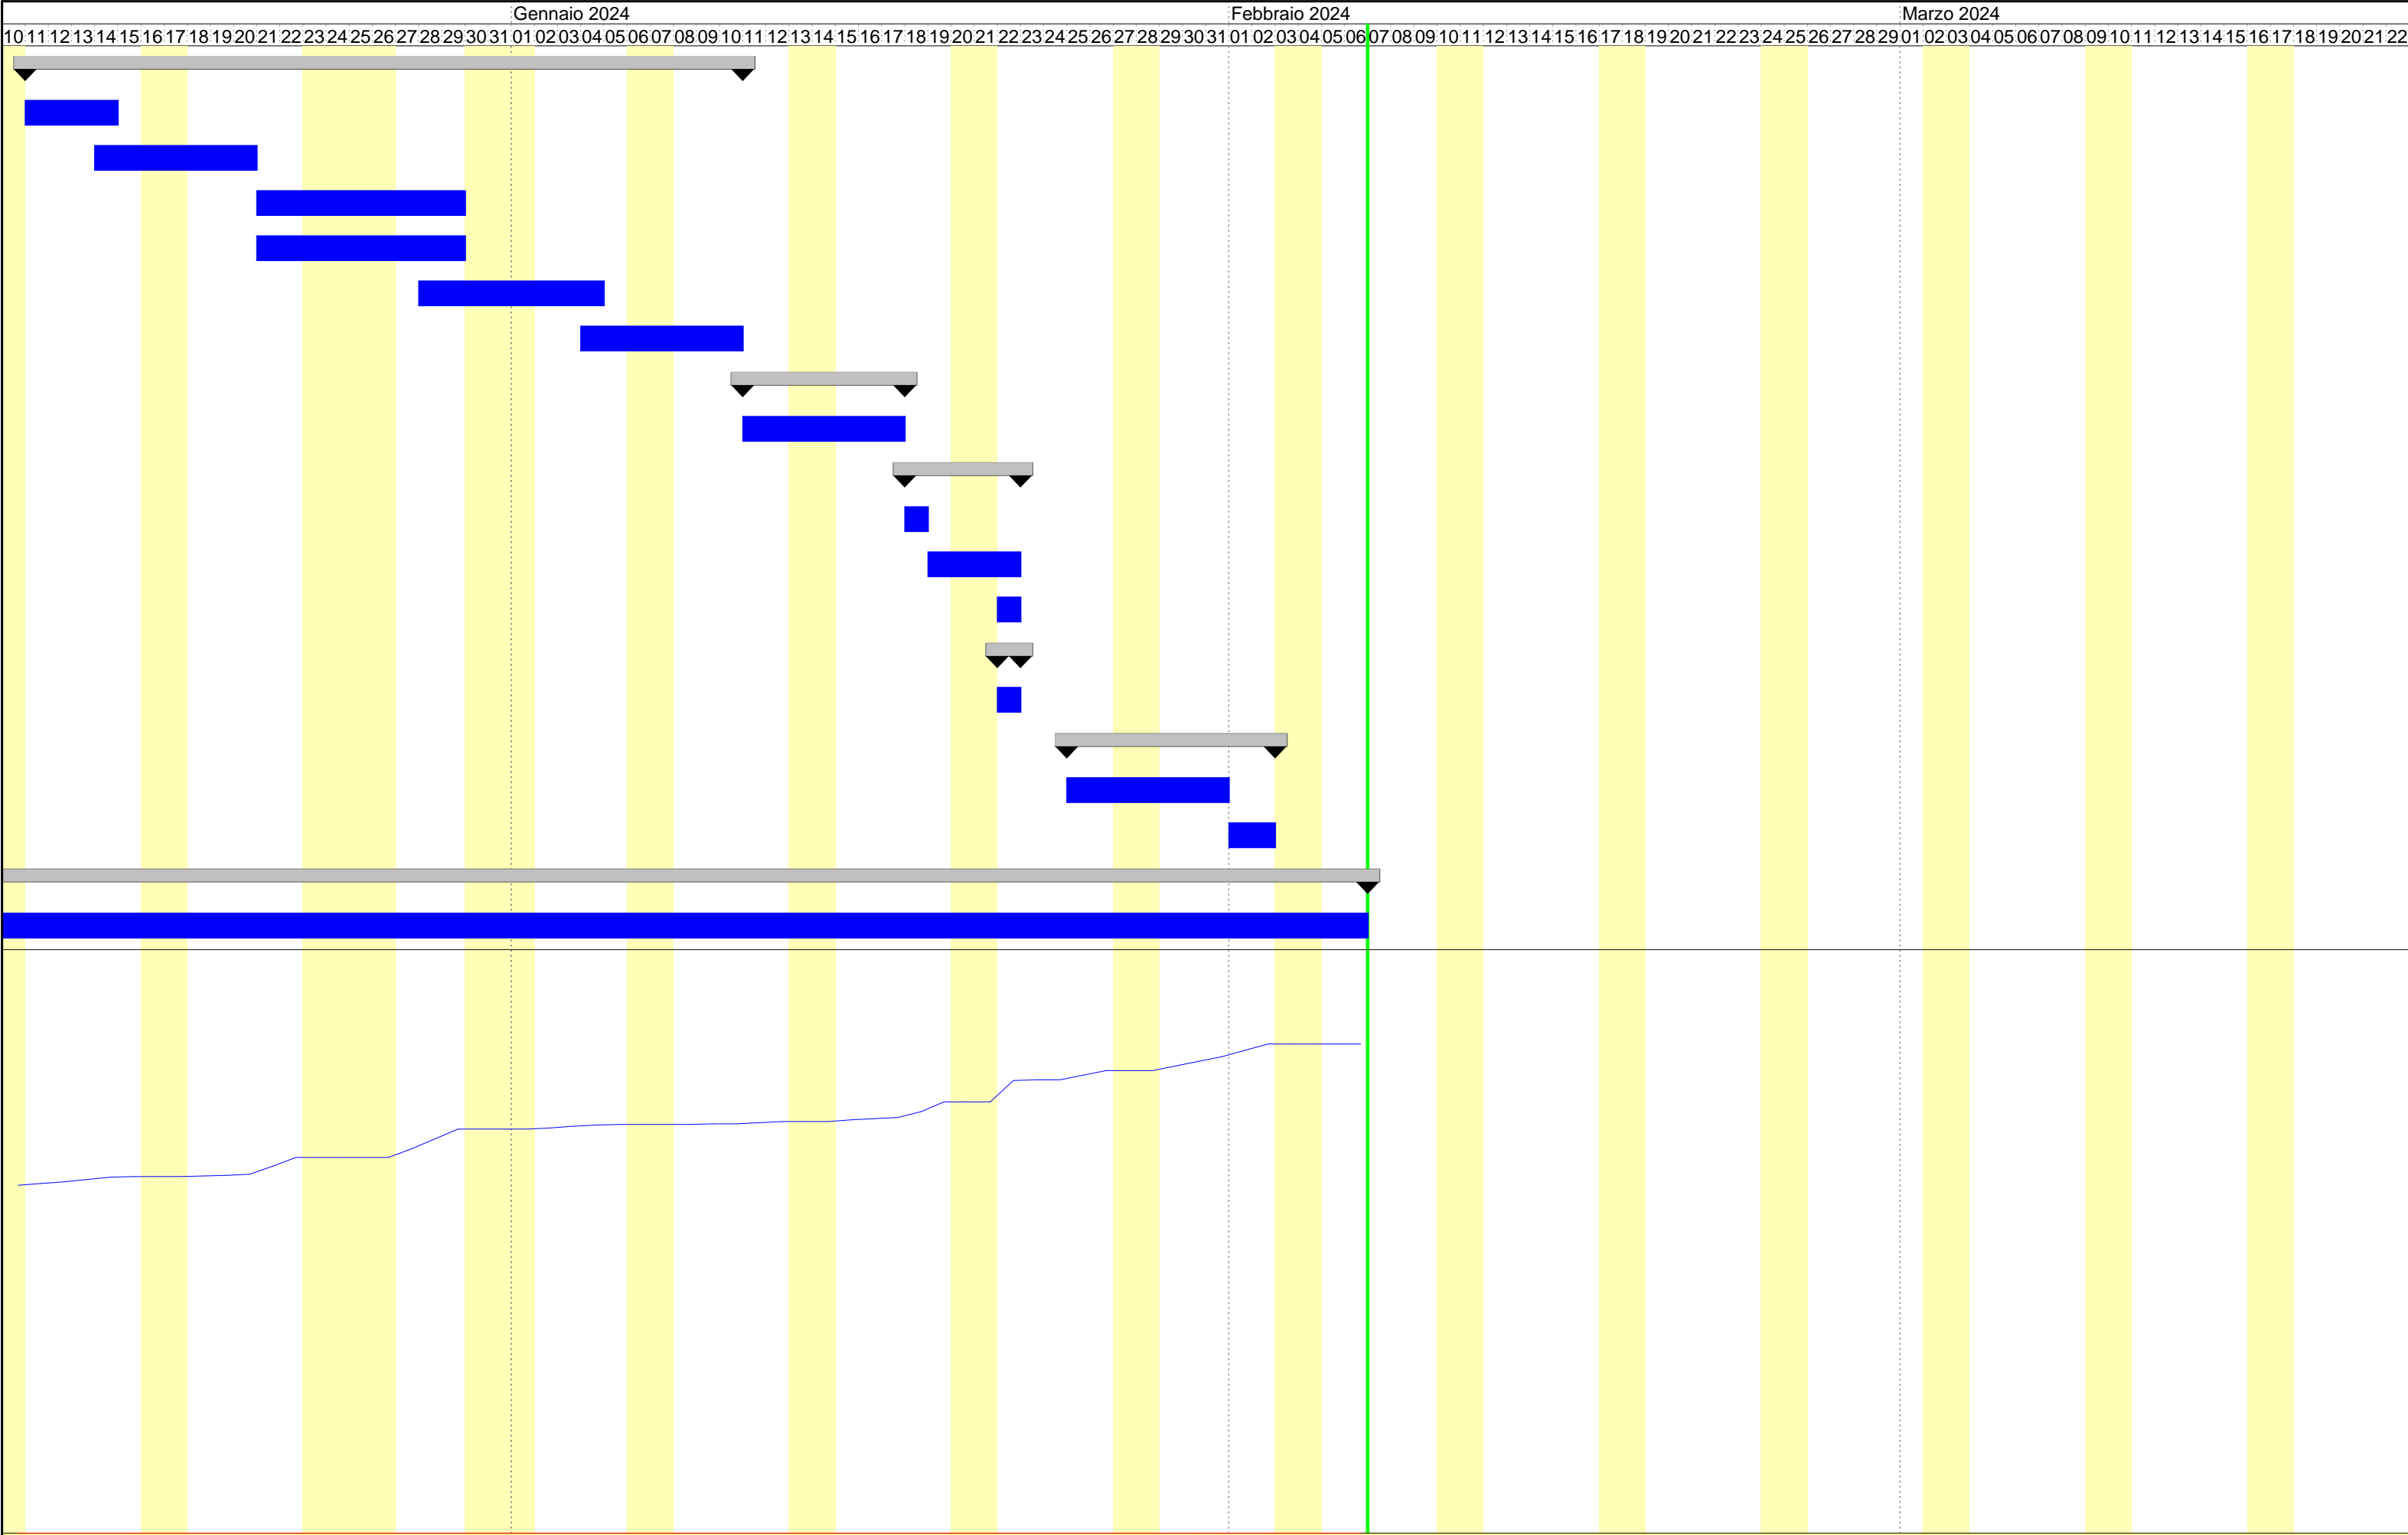

| Tariffa  | Descrizione  | UM | Previsto | Prezzo | Importo  | Eseguito | Imp. Eseguito | % Eseguita | Inizio     | Fine       | GG Lav. |
|--|--|----|----------|--------|----------|----------|---------------|------------|------------|------------|---------|
| € Lavori a MISURA(Importo: 60 000.00, Importo Eseguito: 0.00)                    |  |    |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| € OPERE PROPEDEUTICHE(Importo: 4 048.20, Importo Eseguito: 0.00)                 |  |    |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| C.02   | Operaio qualificato  | h  | 65       | 30.10  | 1 956.50 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 1       |
| C.03   | Operaio specializzato  | h  | 65       | 32.18  | 2 091.70 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 02/10/2023 | 02/10/2023 | 1       |
| € DEMOLIZIONI E RIMOZIONI(Importo: 106.09, Importo Eseguito: 0.00)               |  |    |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| 10.1.BY1.02  | DEMOLIZIONE DI   |    |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| .A   | EDIFICI Per edifici del volume fino a 5000 m3  | m³ | 8.66     | 12.25  | 106.09   | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 1       |
| € SCAVI E RIPORTI(Importo: 1 571.86, Importo Eseguito: 0.00)                     |  |    |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| 11.7.CP1.04  | SCAVO DI FONDAZIONE  |    |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| .A   | IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUI ... I Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) | m³ | 39       | 27.86  | 1 086.54 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 1       |
| 11.8.CP1.01  | RIPORTI IN MATERIALE   |    |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| .A   | MISTO DI CAVA Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO                               | m³ | 11.7     | 41.48  | 485.32   | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 09/10/2023 | 09/10/2023 | 1       |
| € GIUNTO TECNICO(Importo: 1 670.07, Importo Eseguito: 0.00)                      |  |    |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| 46.2.KN6.02  | ISOLAMENTO TERMICO   |    |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| .D   | A CAPPOTTO SU SUPERFICI ESTERNE IN POLISTIRENE ESTRUSO Spessore isolante 6 cm                        | m² | 13.04    | 93.69  | 1 221.72 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 09/10/2023 | 09/10/2023 | 1       |
| 46.2.KN6.02  | ISOLAMENTO TERMICO   |    |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| .E   | A CAPPOTTO SU SUPERFICI ESTERNE IN POLISTIRENE ESTRUSO Sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore   | m² | 91.28    | 3.89   | 355.08   | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 09/10/2023 | 09/10/2023 | 1       |
| 41.9.MH2.0   | PARASPIGOLI, ZOCCOLI,  |    |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| 1.D  | PROFILI PER DELIMITAZIONE INTONACI, ... rofilo per giunto a vista sigillato con mastice silconico    | m  | 11.5     | 8.11   | 93.27    | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 09/10/2023 | 09/10/2023 | 1       |
| € CALCESTRUZZI E CALCESTRUZZI ARMATI(Importo: 20 455.08, Importo Eseguito: 0.00) |  |    |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| 13.1.EQ4.01  | MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI                              | m³ | 10.44    | 157.51 | 1 644.40 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 12/10/2023 | 18/10/2023 | 5       |
| 16.5.EQ4.02  | PLATEE DI FONDAZIONE   |    |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| .B   | IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO C25/30 Rck30-XC2-S4  | m³ | 17.44    | 271.75 | 4 739.32 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 19/10/2023 | 25/10/2023 | 5       |
| 20.1.EQ4.04  | MURATURE IN  |    |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| .G   | ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore da 16 a 25 cm                   | m3 | 13.34    | 446.96 | 5 962.45 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 26/10/2023 | 02/11/2023 | 5       |
| 20.1.EQ4.01  | TRAVI, PILASTRI IN   |    |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| .C   | CALCESTRUZZO ARMATO C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4  | m3 | 0.45     | 456.49 | 205.42   | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 02/11/2023 | 08/11/2023 | 5       |



| Tariffa  | Descrizione  | UM      | Previsto | Prezzo | Importo  | Eseguito | Imp. Eseguito | % Eseguita | Inizio     | Fine       | GG Lav. |
|--|--|---------|----------|--------|----------|----------|---------------|------------|------------|------------|---------|
| 20.1.EQ4.05  | TRAVI-VELETTA IN CALCESTRUZZO ARMATO C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4   | m3      | 0.66     | 482.32 | 318.33   | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 09/11/2023 | 15/11/2023 | 5       |
| 20.1.EQ4.02  | SOLETTE IN CALCESTRUZZO ARMATO C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4   | m3      | 8.7      | 446.57 | 3 885.16 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 16/11/2023 | 22/11/2023 | 5       |
| NP001  | CASSEFORME IN POLISTIROLO ESTRAIBILI E RIUTILIZZABILI  | cadauno | 24       | 50.00  | 1 200.00 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 09/11/2023 | 15/11/2023 | 5       |
| NP002  | SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA DEL C.A.   | a corpo | 1        | 500.00 | 2 500.00 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 1       |
| € ACCIAIO PER C.A.(Importo: 7 668.49, Importo Eseguito: 0.00)                  |  |         |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| 20.3.DH2.01  | ACCIAIO TONDE PER C.A. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata                          | kg      | 1674.3   | 2.25   | 3 767.18 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 12/10/2023 | 09/11/2023 | 20      |
| 20.3.DH2.01  | ACCIAIO TONDE PER C.A. Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)                                    | kg      | 1765.3   | 2.21   | 3 901.31 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 12/10/2023 | 09/11/2023 | 20      |
| € TAMPONAMENTI (Importo: 2 451.58, Importo Eseguito: 0.00)                     |  |         |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| 21.1.FQ4.01  | MURATURA IN BLOCCHI PORTANTI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO Blocco da 20x20x40 cm  | m³      | 8.75     | 280.18 | 2 451.58 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 1       |
| € IMPERMEABILIZZAZIONE(Importo: 4 417.22, Importo Eseguito: 0.00)              |  |         |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| 47.2.LN2.01  | IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE CON MEMBRANA BITUMINOSA  | m²      | 42       | 34.43  | 1 446.06 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 24/11/2023 | 29/11/2023 | 4       |
| 41.1.PQ3.02  | MALTA CEMENTIZIA OSMOTICA PER IMPERMEABILIZZAZIONE   | m²      | 97.8     | 30.38  | 2 971.16 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 24/11/2023 | 29/11/2023 | 4       |
| € MASSETTO(Importo: 346.63, Importo Eseguito: 0.00)                            |  |         |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| 43.1.EQ4.01  | SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI Fino a 8 cm  | m²      | 15.6     | 22.22  | 346.63   | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 30/11/2023 | 05/12/2023 | 4       |
| € INTONACI (Importo: 357.54, Importo Eseguito: 0.00)                           |  |         |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| 41.1.PQ1.02  | INTONACO PREMISCELATO PER ESTERNI A BASE CALCE-CEMENTO A DUE STRATI (RINZAFFO E DRIZZATURA)                              | m²      | 14.96    | 23.90  | 357.54   | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 1       |
| € PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ESTERNI (Importo: 7 268.44, Importo Eseguito: 0.00) |  |         |          |        |          |          |               |            |            |            |         |
| 41.6.SE0.01  | Fornitura e posa in opera di rivestimento per pavimenti i ... so ponteggi. In marmo di Trani, Botticino, Giallo d'Istria | m²      | 2.9      | 305.04 | 884.62   | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 11/12/2023 | 14/12/2023 | 4       |
| 43.2.SE2.01  | PAVIMENTI IN MARMO In marmo di Trani   | m²      | 0.96     | 271.93 | 261.05   | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 14/12/2023 | 20/12/2023 | 5       |

| Tariffa   | Descrizione  | UM      | Previsto | Prezzo   | Importo  | Eseguito | Imp. Eseguito | % Eseguita | Inizio     | Fine       | GG Lav. |
|---|--|---------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|------------|------------|---------|
| 41.2.RE0.01   | RIVESTIMENTI IN LASTRE DI PIETRA In marmo di Trani   | m²      | 22.2     | 215.25   | 4 778.55 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 5       |
| 41.2.RE0.01   | RIVESTIMENTI IN LASTRE DI PIETRA Sovraprezzo per lucidatura parti viste                                  | m²      | 22.2     | 26.14    | 580.31   | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 21/12/2023 | 29/12/2023 | 5       |
| 43.2.SG5.01   | PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO Finitura a vista antisdrucciolo                        | m²      | 11.55    | 63.30    | 731.12   | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 28/12/2023 | 04/01/2024 | 5       |
| 43.6.HH4.01   | GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI Larghezza max giunto fino a 20 mm                                    | m       | 2.6      | 12.61    | 32.79    | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 04/01/2024 | 10/01/2024 | 5       |
| € TINTEGGIATURA(Importo: 604.91, Importo Eseguito: 0.00)  |  |         |          |          |          |          |               |            |            |            |         |
| 41.3.VV7.01   | IDROPITTURA LAVABILE SU SUPERFICI ESTERNE Con pittura acrilica e polveri di quarzo                       | m²      | 30.8     | 19.64    | 604.91   | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 11/01/2024 | 17/01/2024 | 5       |
| € ACCESSORI PER LOCULI (Importo: 3 700.00, Importo Eseguito: 0.00)  |  |         |          |          |          |          |               |            |            |            |         |
| NP003   | SIGILLI DI CHIUSURA LOCULI   | cadauno | 24       | 30.00    | 720.00   | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 1       |
| NP004   | FRONTALINO COPERTURA   | a corpo | 1        | 500.00   | 2 500.00 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 19/01/2024 | 22/01/2024 | 2       |
| NP005   | FERRAMENTA PER LASTRE LOCULI   | cadauno | 24       | 20.00    | 480.00   | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 1       |
| € IMPIANTO ELETTRICO(Importo: 1 000.00, Importo Eseguito: 0.00)   |  |         |          |          |          |          |               |            |            |            |         |
| NP006   | IMPIANTO ELETTRICO   | a corpo | 1        | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 1       |
| € OPERE DI COMPLETAMENTO(Importo: 4 333.89, Importo Eseguito: 0.00)   |  |         |          |          |          |          |               |            |            |            |         |
| NP007   | SISTEMAZIONE GENERALE DELL'AREA  | a corpo | 1        | 833.89   | 2 833.89 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 25/01/2024 | 31/01/2024 | 5       |
| NP008   | RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO LAPIDI RICORDO  | a corpo | 1        | 500.00   | 1 500.00 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 01/02/2024 | 02/02/2024 | 2       |
| € COSTI SICUREZZA (speciali)(Importo: 3 000.00, Importo Eseguito: 0.00)   |  |         |          |          |          |          |               |            |            |            |         |
| € Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi S(Importo: 3 000.00, Importo Eseguito: 0.00) |  |         |          |          |          |          |               |            |            |            |         |
| SIC.SPCL  | Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali" | %       | 100      | 3        | 3 000.00 | 0.00     | 0.00          | 0.000      | 02/10/2023 | 06/02/2024 | 87      |
